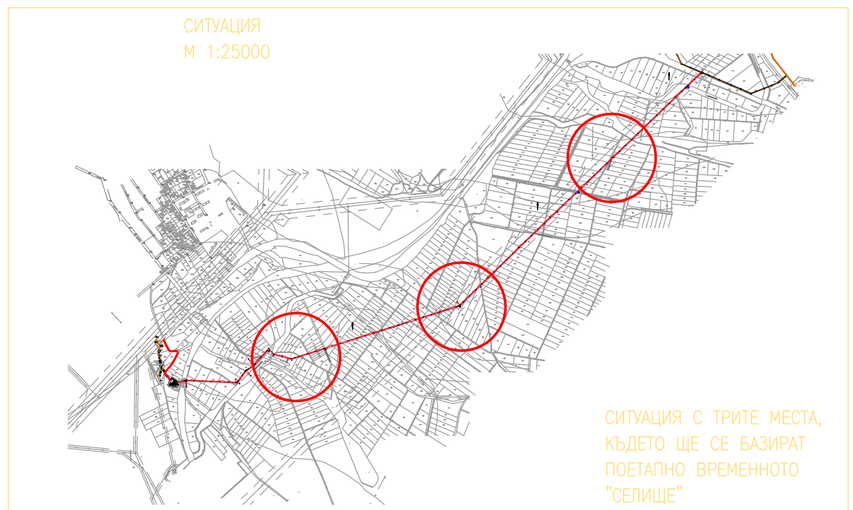


ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ С ПОСОКА НА ЕВАКУАЦИЯ И ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
EVACUATION ROUTE WITH DIRECTIONS AND PEDESTRIAN PATH

1.Основните изходи и пешеходни пътеки при възникване на пожар или авария са изходите от стр. площадка.
1.The exits from the construction site are used as main exits and pedestrian paths during fire or other type of emergencies.
2.На кота ±0.00м ще се използват всички изходи.
2.All exits at level ±0.00m will be used.
3.Евакуационните пътища да се обозначават с трайна маркировка.
3.The evacuation routes should be designated with durable marking.

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
SYMBOLS:

- ОГРАДА / FENCE
- ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ НА СТР. МЕХАНИЗАЦИЯ / DIRECTION FOR THE MOVEMENT OF THE CONSTR. MECHANIZATION
- МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ / PARKING SPACE FOR THE CONSTRUCTION MECHANIZATION
- ВРЕМЕННО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ / TEMPORARY ARTIFICIAL LIGHTING
- МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ / FIRST AID POST
- ЗВУКОВ СИГНАЛ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ИЛИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕВАКУАЦИЯ / SOUND ALARM FOR EMERGENCIES OR EVACUATION

KEY:

1.ENTRANCE AND EXIT DOOR WITH A LOCK
2.CLEANING GROUND FOR THE CONSTRUCTION MECHANIZATION WITH A DITCH
3.CONSTRUCTION SITE PERSONNEL DOOR
4.SECURITY OF THE CONSTRUCTION SITE
5.SIGN ACCORDING TO CLAUSE 13 OF REGULATION N2 AND CLAUSE 167.2 FROM "Z.U.T."
6.BARRIER
7.CLERKS' OFFICE–CARAVAN – 1 OFFICE FOR THE TECHNICAL MANAGER, FOR THE COORDINATOR OF THE CONSTRUCTION AND FOR THE CONSTRUCTION SUPERVISOR
8.CHANGING ROOM – 1
9.TOILET–CHEMICAL
10.SINK–WATER–CARRIER TRUCK
11.STORAGE FOR WATER PIPES
12.FIRE PRECAUTION BOARD WITH SIGNS ACCORDING RES
13.FRAMEWORK STORAGE
14.STEEL REINFORCEMENT BARS STORAGE
15.CLOSED STORE OF THE CONSTRUCTION COMPANY
16.CONTAINER FOR CONSTRUCTION WASTE
17.STORE OF THE CONTRACTOR INCLUDING A VENTILATED ROOM – CARAVAN
18.TEMPORARY ELECTRIC SUPPLY, OIL–ELECTRIC ENGINE
19.CONCRETE PUMP SCHWING
20.DUMPCRETE TRUCK
21.TRUCK–CRANE
22.PARKING SPACE FOR THE CONSTRUCTION MECHANIZATION
23.SIGN WITH TELEPHONE NUMBERS OF EMERGENCY, FIRE–BRIGADE
24.SIGN "WEARING OF HELMETS IS A MUST"

ЛЕГЕНДА:

1.ПОДХОД, ИЗХОД СЪС ЗАКЛЮЧВАЩА СЕ ВРАТА
2.ПЛОЩАДКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СТР. МЕХАНИЗАЦИЯ С КАНАВКА
3.ВРАТА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ОБЕКТА
4.ОХРАНА НА ОБЕКТА
5.ТАБЕЛА СЪГЛАСНО ЧЛ.13 ОТ НАРЕДБА N2 И ЧЛ.167 АЛ.2 ОТ ЗУТ
6.БАРИЕРА
7.КАНЦЕЛАРИЯ–ФУРГОН – 1 БРОЙ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ, КООРДИНАТОР В СТРОИТЕЛСТВОТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
8.СЪБЛЕКАЛНЯ И СТОЛОВА – 1 БРОЙ
9.ТОАЛЕТНА – ХИМИЧЕСКА
10.МИВКА – ВОДОНОСКА
11.СКЛАД ТРЪБИ
12.ПРОТИВОПОЖАРНО ТАБЛО С ТАБЕЛИ ПО ПАБ
13.СКЛАД ЗА КОФРАЖ
14.СКЛАД ЗА АРМИРОВКА
15.ЗАКРИТ СКЛАД НА СТРОИТЕЛЯ – ФУРГОН
16.КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
17.СКЛАД НА СТРОИТЕЛЯ СЪС ЗАТВОРЕНО ПРОВЕТРИВО ПОМЕЩЕНИЕ
18.ВРЕМЕННО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ СЪС РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ИЛИ ДИЗЕЛАГРЕГАТ
19.БЕТОНПОМПА SCHWING
20.БЕТОНОВОЗ
21.АВТОКРАН ТРЪБОПОЛАГАЧ
22.МЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ НА СТР. МЕХАНИЗАЦИЯ
23.ТАБЕЛА С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА НА БЪРЗА ПОМОЩ И ПОЖАРНА
24.ТАБЕЛА: "ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕНЕТО НА ПРЕДПАЗНИ КАСКИ"; "ВЛИЗАНЕТО НА ВЪНШНИ ЛИЦА СТРОГО ЗАБРАНЕНО"

REVISION	DATE	NAME	APPROVED	MODIFICATION
Rev. E				
Rev. D				
Rev. C				
Rev. B				
Rev. A	___.2008	_____	_____	_____

ALL RIGHTS RESERVED ! This drawing and the information contained therein is the property of Joint Venture. No part of this drawing may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright holder.

EMPLOYER
MINISTRY OF ENVIROMENT AND WATER
Directorate "European Union Funds for Enviroment"
ISPA Measure No 2002/BG/16/P/PE/018

FINAL APPROVEL

CONSULTANT - JOINT VENTURE
DIWI Consult International GmbH
LEADING PARTNER
LOPP

PROJECT / ОБЕКТ	SHOUMEN WATER CYCLE IMPROVEMENTS - BULGARIA Lot No 1 : Network Design ПОДОБРЕНИЕ НА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА гр. ШУМЕН-БЪЛГАРИЯ Лот № 1 Проект на мрежата
PART / ЧАСТ	SEWERAGE NETWORK КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
DRAWING TITLE / СЪДЪРЖАНИЕ	PRESSURE PIPELINE LAYOUT WITH SCHEME FOR EMERGENCY PREVENTION. EVACUATION PLAN ТЛАСКАТЕЛ СХЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ. ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ

TEAM LEADER РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП	C. HAMILTON К. ХАМИЛТОН		COORDINATED СЪГЛАСУВАЛ	G. SUP. ГЛ.	PHASE ФАЗА	DD РП	
TASK MANAGER ЗАДАЧЕН МЕНИДЖЪР	R. KOTHE P. КОТЕ		TECHN. ТЕХН.	EL ЕЛ	SCALE МАЩАБ	1 : 500 1 : 500	
DESIGNER ПРОЕКТАНТ	I. TOPUROVA И. ТОПУРОВА		ARCH. АРХ.	SCADA КИПиА	DATE ДАТА	2009	
DESIGNER ПРОЕКТАНТ			CONSTR. КОНСТР.	HV ОВН	REVISION РЕВИЗИЯ	0	
			VP ВП	WSSS ВК	DRAWING No ЧЕРТЕЖ No	DD / SH / V-H / 02 / 006	

ARCHIVE АРХИВ							
PART ЧАСТ	Health and Safety plan ПБЗ						
